

شماره نامه: م/س/۱۴۰۵۹۹

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

پیوست: دارد

سبدگردان آرات (سهامی خاص)
ARARAT ASSET MANAGEMENT

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر نظیفی

مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی ایران

موضوع: آخرین وضعیت پیشرفت شرکت پروژه پایدار انرژی تهران

با سلام و احترام؛

پیرو اطلاعیه ناظر محترم صندوق سرمایه گذاری نماد (هورسان) آخرین وضعیت پیشرفت شرکت پروژه پایدار انرژی تهران به پیوست ایفاد می گردد. شایان ذکر است تغییرات قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق ناشی از ساز و کار عرضه و تقاضا و معاملات بازار بوده است. همچنین به سرمایه گذاران محترم توصیه می گردد نسبت به پارامترهای اقتصادی پروژه توجه نمایند.

پیشاپیش از حسن توجه و همکاری جنابعالی کمال امتنان را دارد.

احسان آقاسی
سبدگردان آرات (سهامی خاص)
مدیر صندوق
شماره ثبت ۶۵۱۰۰۶



شرکت پایدار انرژی تهران
Paydar Energy Tehran Co.

شماره ثبت ۶۵۸۸۷۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

شماره نامه: م/ص/۱۸/۱۴۰۵

پیوست: دارد

باسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی

موضوع: ارائه گزارش پیشرفت پروژه شرکت پایدار انرژی تهران

با سلام و احترام؛

پیرو ماده ۵۲ اساسنامه صندوق و در راستای اطلاع رسانی از روند اجرایی فعالیت‌ها، بدین وسیله گزارش پیشرفت پروژه شرکت پایدار انرژی تهران تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ به پیوست ایفاد می گردد.

کسری جوکار
مدیرعامل

تلفن | ۰۲۱-۸۶۱۹۹۸۵۵

شناسه ملی | ۱۴۰۱۴۷۸۹۶۰۵

کدپستی | ۱۹۹۱۷۱۵۹۳۹

تهران، خیابان ملاصدرا، بعد از خیابان

شیرازی، پلاک ۱۵۷، طبقه ۶، واحد ۶۲



Afagh Energy Pars CO

Dehaghan 10 MW Solar PV Power Plant

AEP Contract No. : [CNT-ATO-AEP-001](#)

Weekly Progress Report

Report No. : [19](#)

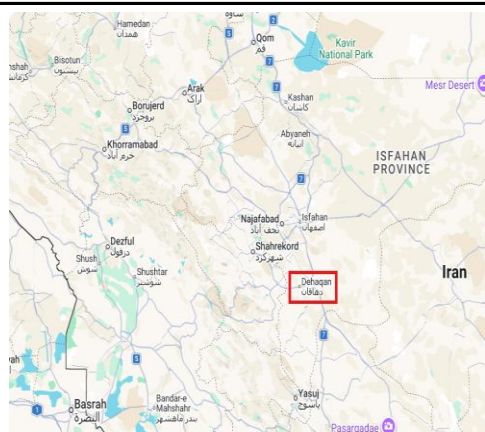
From : [1405/07/13](#) to [1405/07/19](#)

Report Date : [1405/07/19](#)



Afagh Energy Pars CO

Project Overview



Project Information:

Project Contract No. : CNT-ATO-AEP-001

Project Description: Dehghan 10MW Solar PV Power Plant

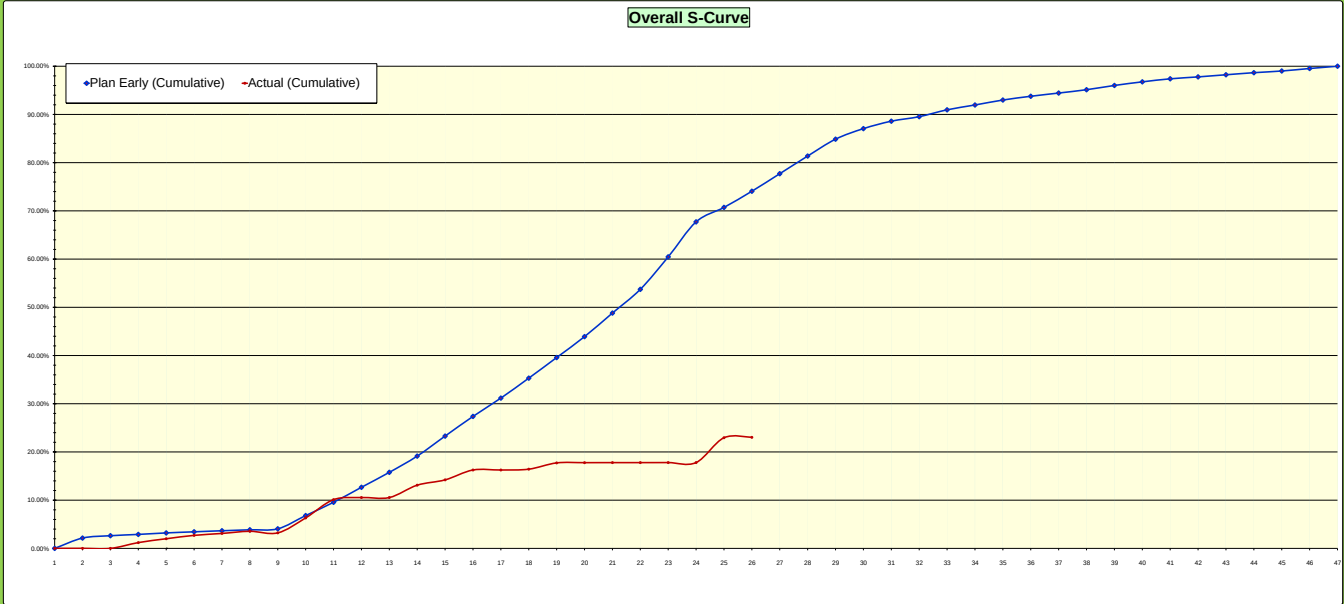
Location: Dehghan County, Isfahan Province

Effective Date: 1405/03/02

Duration: 9 Month

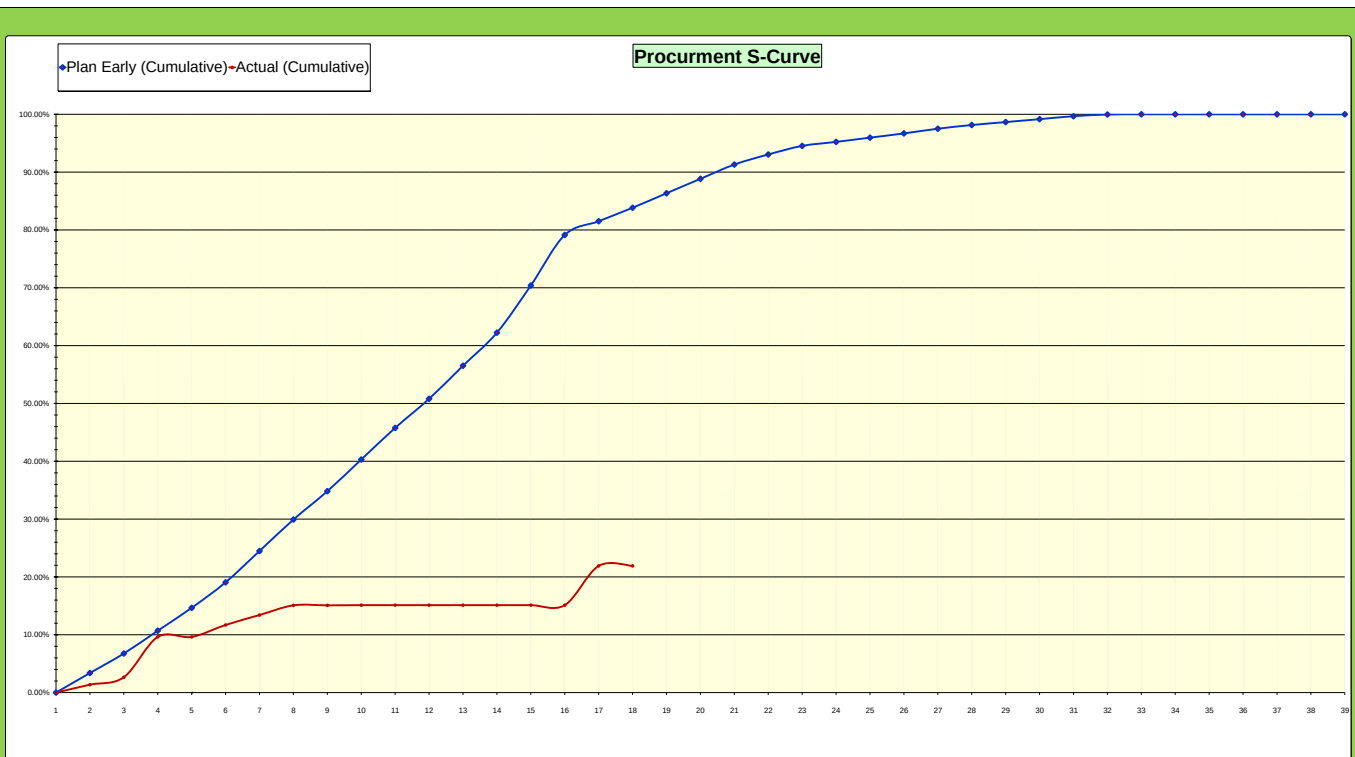
ردیف	شرح مایلستون	وضعیت انجام			توضیحات	تاریخ تکمیل
		آغاز شده	در حال انجام	کامل شده		
۱	قرارداد هیدرولوژی	✓			ابلاغ قرارداد به شرکت "ارمان راه آسیا" انجام شده . در خرداد ماه ۱۴۰۵ گزارش هیدرولوژی توسط پیمانکار ارائه شده و بابت پیشرفت ۹۰٪ صورت وضعیت ارسال شده است . نقطه نظرات اصلاحی مدیر طرح به شرکت ارمان راه آسیا ارسال شده است . (پرداخت صورتحساب منوط به اخذ تایید موارد ذیل از مشاور طراحی و مدیر طرح می باشد)	۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
۲	تحويل زمین نیروگاه			✓	تحويل زمین از فرمانداری انجام شده است	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۳	مطالعات ژئوتکنیک و تست Pull Out			✓	صورت وضعیت نهایی شرکت "عمران آزما" ارسال شده است	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۴	قرارداد فنس کشی و ساخت سر درب نیروگاه			✓	صورتحساب تحويل قطعی	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۵	قرارداد مدیر طرح			✓	قرارداد با آفاق انرژی پارس منعقد شده است .	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۶	قرارداد شرکت طراحی و مهندسی مشاور			✓	قرارداد با "کاژه ویسمن" منعقد شده . الحاقیه شماره یک زمانی قرارداد شرکت کاژه ویسمن تا پایان مهرماه تهیه شده است .	۱۴۰۵/۰۲/۰۸ شهریور ۱۴۰۵
۷	قرارداد مطالعات اتصال به شبکه			✓	قرارداد شرکت بصیر اندیشان خلاق به عنوان برنده مناقصه امضا و مبادله شده است .	۱۴۰۵/۰۶/۱۴
۸	قرارداد تامین پیل و اینورتر			✓	قرارداد امضا و مبادله شده است . تضامین پیش پرداخت و حسن انجام کار ارائه شده است . با پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما ، قرارداد شروع خواهد گردید .	۱۴۵۰/۰۵/۰۶ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
۹	قرارداد تامین سازه های فلزی			✓	قرارداد امضا و مبادله شده است . تضامین پیش پرداخت و حسن انجام کار ارائه شده است . پیش پرداخت توسط کارفرما پرداخت شد و قرارداد شروع شد.	۱۴۵۰/۰۵/۰۶ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
۱۰	قرارداد تامین کابل			✓	قرارداد امضا و مبادله شده است . تضامین پیش پرداخت و حسن انجام کار ارائه شده است . پیش پرداخت توسط کارفرما پرداخت شد و قرارداد شروع شد.	۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
۱۱	قرارداد تامین پست ها کمپکت	✓			تامین کننده انتخاب شده و قرارداد در حال امضا و مبادله میباشد .	مرداد ۱۴۰۵
۱۲	قرارداد تامین اسمارت لاگر	✓			مراحل انتخاب تامین کننده در حال انجام است .	مرداد ۱۴۰۵

Dehaghan 10MV Solar Power Plant

[illegible]

[illegible]

Dehqahan 10MV Solar Power Plant

[illegible]



Abarkooh 3MW Solar PV Power Plant

AEP Contract No. : [CNT-ATO-AEP-001](#)

Weekly Progress Report

Report No. : [19](#)

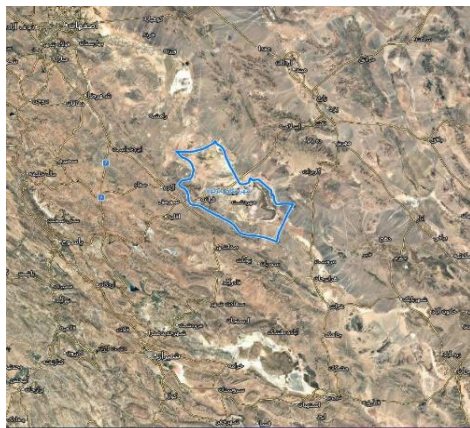
From : [1405/07/13](#) to [1405/07/19](#)

Report Date : [1405/07/19](#)



Afagh Energy Pars CO

Project Overview



Project Information:

Project Contract No. : CNT-ATO-AEP-001

Project Description: Abarkooh 3MW Solar PV Power Plant

Location: Abarkooh County, Yazd Province

Effective Date: 1405/03/02

Duration: 9 Month

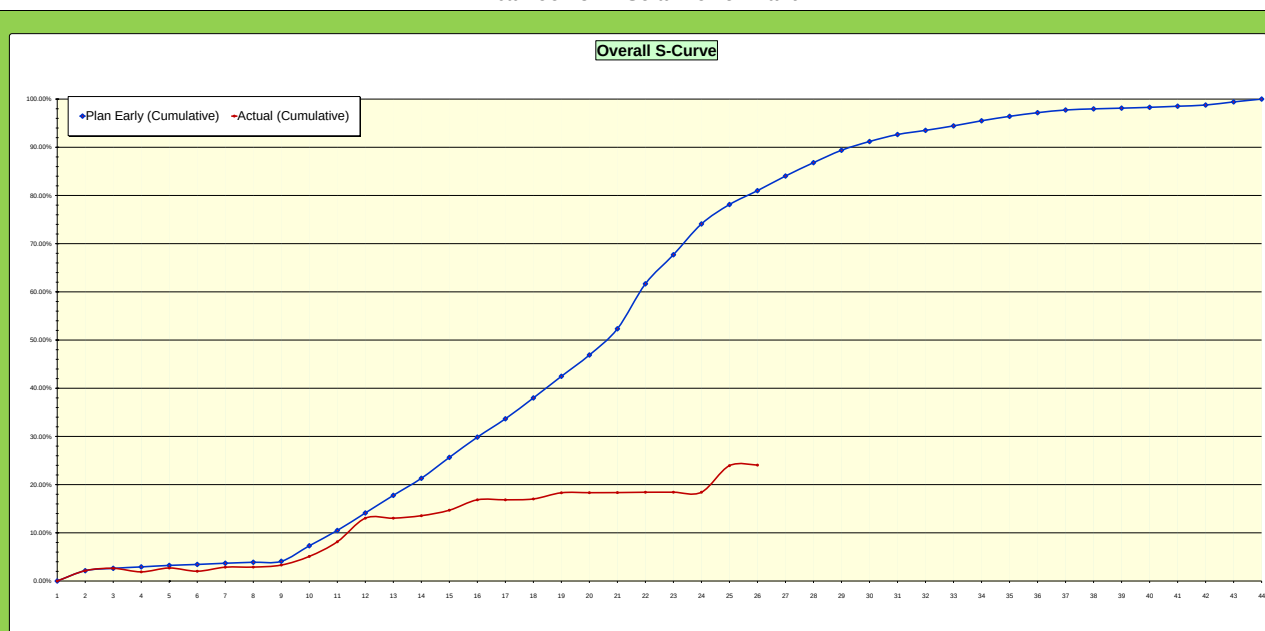
Project Highlights




Afagh Energy Pars CO

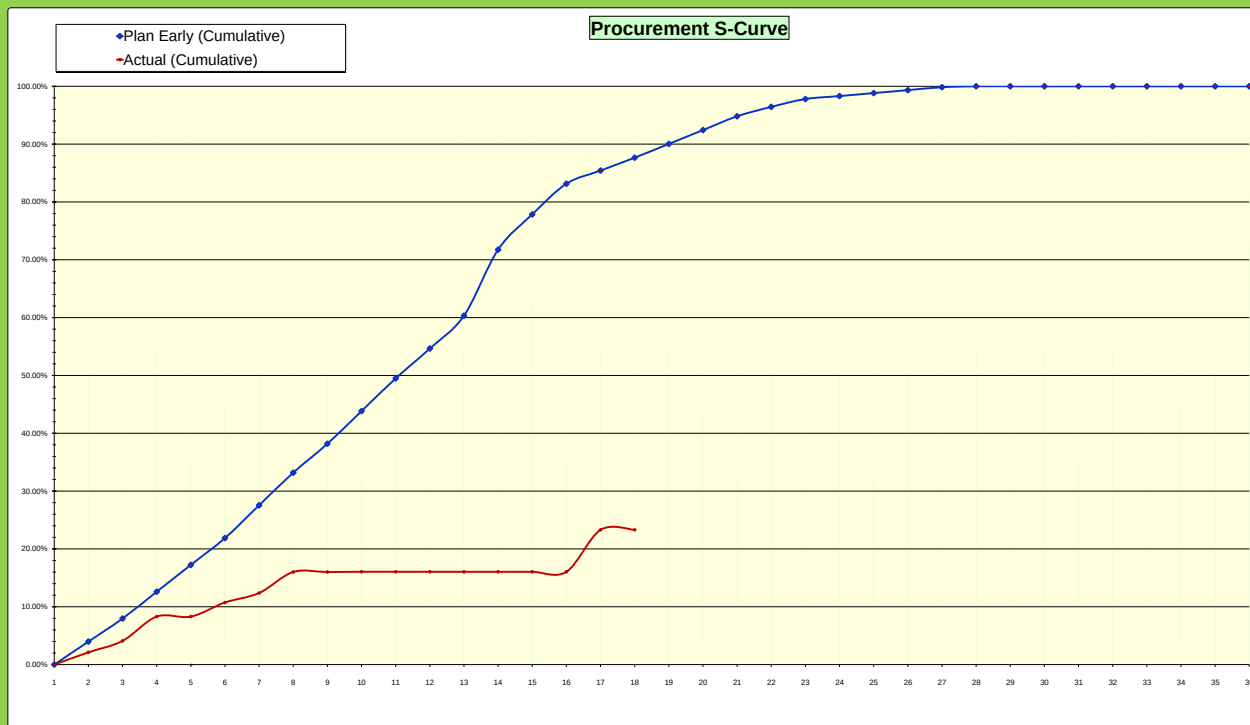
ردیف	شرح مایلستون	وضعیت انجام			توضیحات	تاریخ تکمیل
		آغاز نشده	در حال انجام	کامل شده		
۱	قرارداد هیدرولوژی		✓		ابلاغ قرارداد به شرکت "ارمان راه آسیا" انجام شده . در خرداد ماه ۱۴۰۵ گزارش هیدرولوژی توسط پیمانکار ارائه شده و بابت پیشرفت ۹۰٪ صورت وضعیت ارسال شده است . نقطه نظرات اصلاحی مدیر طرح به شرکت ارمان راه آسیا ارسال شده است . (پرداخت صورتحساب منوط به اخذ تایید موارد ذیل از مشاور طراحی و مدیر طرح می باشد)	۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
۲	تحویل زمین نیروگاه			✓	تحویل زمین از فرمانداری انجام شده است	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۳	قرارداد فنس کشی و ساخت سر درب نیروگاه			✓	صورتحساب تحویل قطعی	۱۴۰۴/۱۲/۲۷
۴	مطالعات ژئوتکنیک و تست Pull Out			✓	صورتحساب وضعیت نهایی شرکت "عمران آزما" ارسال شده است	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۵	قرارداد مدیر طرح			✓	قرارداد با آقای انرژی پارس منعقد شده .	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۶	قرارداد شرکت طراحی و مهندسی مشاور			✓	قرارداد با "کازه ویسمن" منعقد شده . الحاقیه شماره یک زمانی قرارداد شرکت کازه ویسمن تا پایان همراه تهیه شده است .	۱۴۰۵/۰۲/۰۸ شهریور ۱۴۰۵
۹	قرارداد تامین پنل و اینورتر			✓	قرارداد امضا و مبادله شده است . تضامین پیش پرداخت و حسن انجام کار ارائه شده است . با پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما ، قرارداد شروع خواهد گردید .	۱۴۵۰/۰۵/۰۶ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
۱۰	قرارداد تامین سازه های فلزی			✓	قرارداد امضا و مبادله شده است . تضامین پیش پرداخت و حسن انجام کار ارائه شده است . پیش پرداخت توسط کارفرما پرداخت شد و قرارداد شروع شد.	۱۴۵۰/۰۵/۰۶ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
۱۱	قرارداد تامین کابل			✓	قرارداد امضا و مبادله شده است . تضامین پیش پرداخت و حسن انجام کار ارائه شده است . پیش پرداخت توسط کارفرما پرداخت شد و قرارداد شروع شد.	۱۴۵۰/۰۵/۲۵ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
۱۲	قرارداد تامین پست کمپکت		✓		تامین کننده انتخاب شده و قرارداد در حال امضا و مبادله میباشد .	مرداد ۱۴۰۵
۱۳	قرارداد تامین اسمارت لاگر		✓		مراحل انتخاب تامین کننده در حال انجام است .	مرداد ۱۴۰۵
۱۴	خط ۲۰ کیلوولت اتصال به شبکه		✓		مناقشه طراحی و احداث خط ۲۰ کیلوولت اتصال به شبکه	مهر ماه ۱۴۰۵

Abarkooh 3MV Solar Power Plant

[illegible]

[illegible]

Abarkooh 3MV Solar Power Plant

[illegible]
